


30. 05. 2025

Rosario

Santa Fe

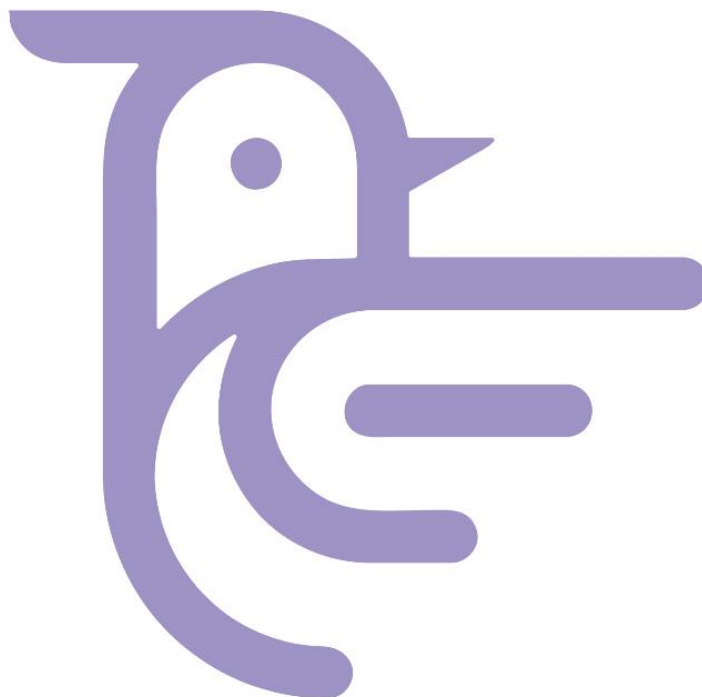

NOSOTROS

Somos una cooperativa de trabajo que ofrece servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) llevado a cabo por un equipo de ingenieros, analistas y técnicos que cuentan con la formación, la capacidad y la experiencia necesaria para llevar adelante con compromiso y responsabilidad cada uno de los proyectos.

Elegimos ser una cooperativa porque esta forma de organización potencia el trabajo colaborativo del amplio conocimiento de cada uno de sus integrantes.

El cooperativismo permite llevar adelante una gestión democrática y participativa de cada uno de los trabajadores en la organización además de tomar un fuerte compromiso con la sociedad en la que se desempeña para transmitir la importancia que tienen las tecnologías de la información en la vida cotidiana de la gente y de las organizaciones.

[Los principios
del cooperativismo
nos forman como
personas además de
formarnos como
profesionales.]



ALCANCE DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema web que permita a los usuarios consultar productos, realizar pedidos y recibir notificaciones por email, utilizando los datos ya existentes en la base de datos del Amazonia.

DESCRIPCION DEL ALCANCE

1. Login de usuario

- Autenticación segura
- Recuperación de contraseña

2. Productos


- Lectura desde la base del ERP
- Filtros y búsqueda
- Visualización de stock, precios y detalles y usuarios

3. Pedidos

- Creación de pedidos con datos de productos
- Registro de pedidos (escritura controlada en la base, o almacenamiento alternativo en una primera instancia)
- Historial del usuario

4. Envío de emails

- Confirmación automática al realizar un pedido
- Notificaciones internas (opcional)
- Configuración de SMTP o API externa

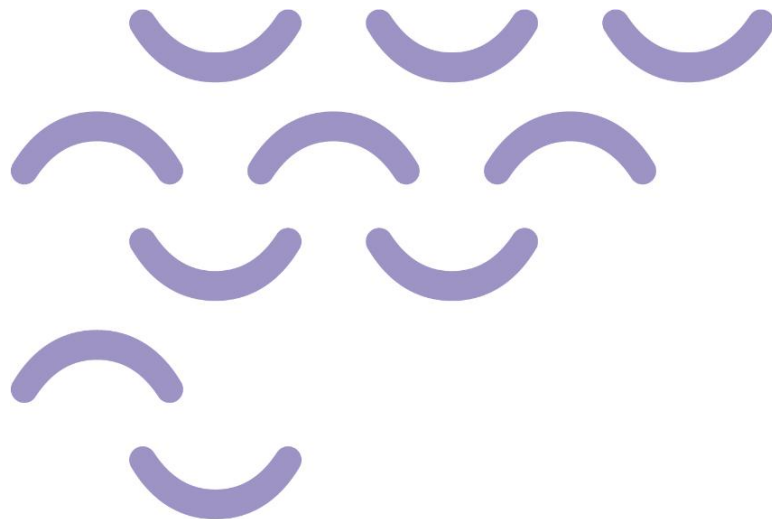

Propuesta
MOLINO INDELMA – PEDIDOS WEB

Módulo	Tiempo estimado
Modulo de usuario	2 semana
Módulo de Productos	3 semanas
Módulo de Pedidos	3 semanas
Envío de emails	2 semana
Listas e informes	2 Semanas
Ajustes de diseño y validaciones finales	3 semanas
Implementación	1 Semana
Total estimado	16 semanas

** Incluye reuniones de seguimiento, testing y documentación básica.*

Consideraciones

- Desarrollo, soporte y mantenimiento continuo durante el primer mes posterior a la implementación
- Desarrollo escalable para futuras mejoras

PRESUPUESTO

640 HORAS Total:	\$ 19.200.000
------------------	---------------

- Los montos mencionados anteriormente no incluyen IVA.

El presupuesto tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión.
